

Informe de Seguimiento Ágil e Iteraciones

Jahidem I. Cobos y Sammy J. Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistema y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

15 de Septiembre de 2026

Configuración del Equipo y Roles (Scrum Framework)

Product Owner: Sammy Josue Arce – Responsable de definir las historias de usuario, priorizar el Product Backlog y validar los criterios de aceptación de cada módulo.

Scrum Master: Jahidem Ignacio Cobos – Responsable de facilitar las reuniones, eliminar impedimentos y asegurar el uso de herramientas (Jira, GitHub y WhatsApp).

Equipo de Desarrollo (Developers):

- **Jahidem Ignacio Cobos** - Enfoque: Frontend en angular 21.
- **Sammy Josue Arce** – Enfoque: Backend en C# con ASP.NET core.

Herramientas de Gestión y Comunicación Utilizadas

- **Gestión del proyecto (tablero Scrum):** Jira.
- **Enlace al tablero:**
<https://npc2025r3.atlassian.net/jira/software/projects/JJ/boards/2/backlog>
- **Repositorio de código (Frontend):**
https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Frontend
- **Repositorio de código (Backend):**
https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Backend
- **Planeación temporal:** ProjectLibre — cronograma general con hitos (metodología Incremental para la línea base y Scrum para la ejecución).
- **Comunicación centralizada:** WhatsApp.

Historial de Iteraciones (Sprints)

Sprint 1 – Inicio

- 9 actividades
- 10 de agosto – 21 de agosto de 2026

Objetivo del sprint

Definir el alcance, el problema, los usuarios, los requerimientos y los criterios iniciales del proyecto TallerControl para establecer una base clara para el desarrollo del sistema.

Iteración 1: Inicio y levantamiento de requerimientos

Periodo: 10 al 21 de agosto de 2026 (Sprint 1). **Estado:** Completada.

Descripción de la Iteración 1

Objetivo de la iteración: Definir el alcance del sistema, identificar la problemática que se quiere resolver, establecer los usuarios involucrados y recopilar, clasificar y priorizar los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema de gestión de información.

Descripción del trabajo realizado: Durante el Sprint 1 se realizaron las actividades de análisis y planeación del proyecto. Se definió el alcance del sistema, se identificó el problema relacionado con la organización y gestión de los procesos del taller, y se establecieron los objetivos y usuarios del sistema. Además, también se realizó la recolección de información mediante encuestas y la observación de los procesos del taller. Con esta información recopilada, se identificaron y clasificaron los requerimientos funcionales y no funcionales, se realizó su priorización y se elaboraron las historias de usuario que servirán como base para el desarrollo de TallerControl.

Resultado del incremento: Se obtuvo una base de requerimientos y planificación para el proyecto, incluyendo la definición del alcance, la identificación de la problemática, los usuarios, los requerimientos funcionales y no funcionales, la priorización y las historias de usuario iniciales del sistema.

Evidencia de Reuniones (Sincrónicas y Asincrónicas)

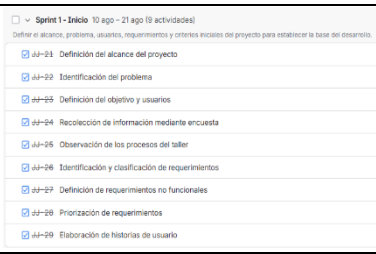
Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 1	ProjectLibre / Jira	Objetivo: Definir el alcance inicial de TallerControl, identificar el problema del taller de mecánica de motocicletas y organizar las actividades del sprint. Acuerdos: Establecer los objetivos, usuarios, requerimientos y elaborar las historias de usuario del proyecto.	
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se avanzó en la definición del alcance, identificación del problema, recolección de información mediante encuesta y observación de los procesos del taller. Qué se hará: Clasificar y priorizar los requerimientos funcionales y no funcionales, y completar las historias de usuario Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron los resultados del levantamiento de información, la identificación de requerimientos y la elaboración de historias de usuario. Qué funcionó: Se logró organizar la información del proyecto y establecer una base para el desarrollo. Por mejorar: Mejorar la estimación de tiempos y la coordinación de las actividades del siguiente sprint.	

Figura 1. Evidencia Sprint y tareas en JIRA

☐ Sprint 1 - Inicio 10 ago – 21 ago (9 actividades)			0	0	0	Completar sprint	...
Definir el alcance, problema, usuarios, requerimientos y criterios iniciales del proyecto para establecer la base del desarrollo.							
☒ JJ-21	Definición del alcance del proyecto	Listo ▾	-				
☒ JJ-22	Identificación del problema	Listo ▾	-				
☒ JJ-23	Definición del objetivo y usuarios	Listo ▾	-				
☒ JJ-24	Recolección de información mediante encuesta	Listo ▾	-				
☒ JJ-25	Observación de los procesos del taller	Listo ▾	-				
☒ JJ-26	Identificación y clasificación de requerimientos	Listo ▾	-				
☒ JJ-27	Definición de requerimientos no funcionales	Listo ▾	-				
☒ JJ-28	Priorización de requerimientos	Listo ▾	-				
☒ JJ-29	Elaboración de historias de usuario	Listo ▾	-				

Tabla 1. Trabajo realizado del sprint 1

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
Definición del alcance del proyecto	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificación del problema	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Definición del objetivo y usuarios	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Recolección de información mediante encuesta	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Observación de los procesos del taller	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificación y clasificación de requerimientos	Sammy Arce	Hecho (Done)
Definición de requerimientos no funcionales	Sammy Arce	Hecho (Done)
Priorización de requerimientos	Sammy Arce	Hecho (Done)
Elaboración de historias de usuario	Sammy Arce	Hecho (Done)

Sprint 2 – Incremento 1

- 15 actividades
- 24 de agosto – 18 de septiembre de 2026

Objetivo del sprint

Implementar las funcionalidades necesarias para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios ofrecidos por el taller, obteniendo una primera versión funcional del sistema.

Iteración 2: Incremento 1 – Autenticación, usuarios y servicios

Periodo: 24 de agosto al 18 de septiembre de 2026 (Sprint 2). **Estado:** Completada.

Descripción de la Iteración 2

Objetivo de la iteración: Desarrollar una primera versión funcional de TallerControl mediante la configuración del proyecto, el diseño de la base de datos, la implementación del módulo de autenticación y el desarrollo de las funcionalidades de usuarios y servicios.

Descripción del trabajo realizado: Durante el Sprint 2 se desarrolló el primer incremento funcional del sistema TallerControl, orientado a la gestión del acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios del taller de mecánica de motocicletas. Se realizaron las actividades de configuración del proyecto, diseño de la base de datos y desarrollo de los módulos de autenticación, usuarios y servicios, utilizando las tecnologías definidas para el proyecto. Las historias de usuario trabajadas en este incremento fueron:

- HU-001: Registro de usuario.
- HU-002: Inicio de sesión.
- HU-004: Visualización de servicios disponibles.
- HU-008: Creación de servicios.

- HU-009: Gestión de usuarios.
- HU-010: Edición de servicios.
- HU-011: Desactivación de servicios.

Además, se completaron las actividades técnicas relacionadas con la integración de módulos, las pruebas del incremento y la corrección de errores. Estas actividades permitieron verificar el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas y consolidar el primer incremento del sistema.

Resultado del incremento: Como resultado del Sprint 2 – Incremento 1, se obtuvo una primera versión funcional de TallerControl, con funcionalidades orientadas a:


- Gestionar el registro y acceso de los usuarios mediante el módulo de autenticación.
- Administrar los usuarios del sistema.
- Visualizar y gestionar los servicios ofrecidos por el taller.
- Integrar los módulos desarrollados.
- Ejecutar las pruebas y realizar la corrección de errores correspondientes.

El incremento representa un avance en la construcción del sistema de información para la gestión del taller de mecánica de motocicletas, permitiendo disponer de una base funcional para el desarrollo de los siguientes módulos y funcionalidades del proyecto.

Evidencia de Reuniones

Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 2	Jira	Objetivo: Planificar el desarrollo del primer incremento de TallerControl. Acuerdos: Desarrollar las funcionalidades de autenticación, usuarios y servicios, junto con las actividades de configuración, integración y pruebas.	
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se realizó la configuración del proyecto, diseño de la base de datos y desarrollo de los módulos de autenticación, usuarios y servicios. Qué se hará: Se completaron las actividades de integración, pruebas del incremento y corrección de errores. Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron las funcionalidades desarrolladas de autenticación, usuarios y servicios, así como la integración, pruebas y corrección de errores. Qué funcionó: La organización del trabajo por módulos y el seguimiento de actividades en Jira. Por mejorar: Mejorar la estimación de tiempos y la validación de criterios de aceptación para los siguientes incrementos.	

Figura 2. Evidencia Sprint y tareas en JIRA

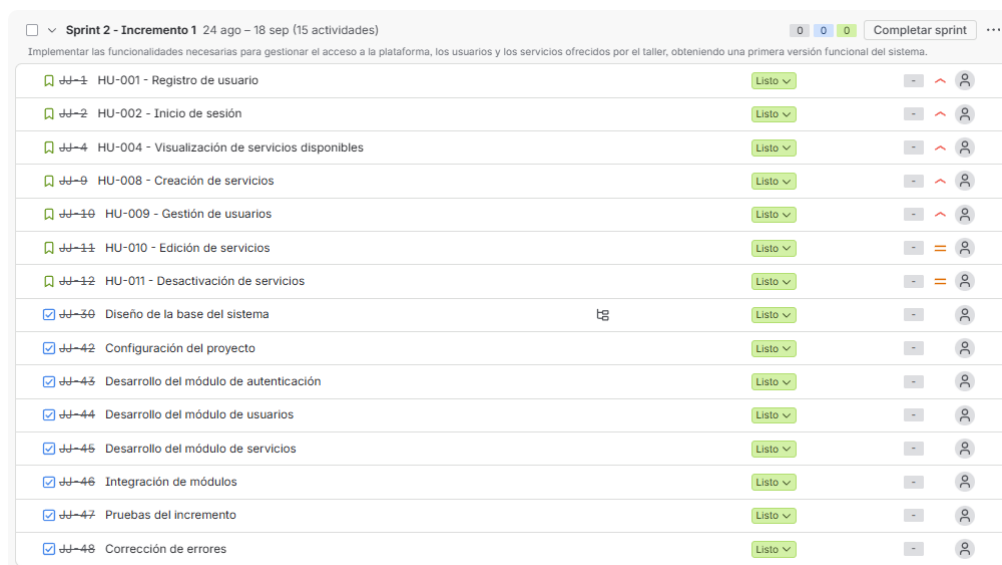

☐ Sprint 2 - Incremento 1 24 ago - 18 sep (15 actividades)	Completar sprint
Implementar las funcionalidades necesarias para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios ofrecidos por el taller, obteniendo una primera versión funcional del sistema.	
📌 HU-001 - Registro de usuario	Listo
📌 HU-002 - Inicio de sesión	Listo
📌 HU-004 - Visualización de servicios disponibles	Listo
📌 HU-008 - Creación de servicios	Listo
📌 HU-009 - Gestión de usuarios	Listo
📌 HU-010 - Edición de servicios	Listo
📌 HU-011 - Desactivación de servicios	Listo
📌 Diseño de la base del sistema	Listo
📌 Configuración del proyecto	Listo
📌 Desarrollo del módulo de autenticación	Listo
📌 Desarrollo del módulo de usuarios	Listo
📌 Desarrollo del módulo de servicios	Listo
📌 Integración de módulos	Listo
📌 Pruebas del incremento	Listo
📌 Corrección de errores	Listo

Tabla 2. Trabajo realizado del sprint 2

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
HU-001 – Registro de usuario	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-002 – Inicio de sesión	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-008 – Creación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-009 – Gestión de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-010 – Edición de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-011 – Desactivación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la base del sistema	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Configuración del proyecto	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de autenticación	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de módulos	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

Matriz de Trabajo Autónomo y Evidencias Directas

Para demostrar el trabajo individual y la autonomía de cada integrante, se consolida el registro de commits, ediciones y tareas completadas:

- **Sammy Arce**
 - Modelado del diagrama entidad-relación y de la base de datos SQL Server (3FN), y configuración de la arquitectura hexagonal del backend.

- **Evidencia:** [Repositorio Back-End \(commits\)](#)
- **Jahidem Cobos**
 - Estructura de componentes standalone y signals en Angular, construcción del dashboard por roles e interfaces completas de módulos realizados, conexión con la API del backend.
 - **Evidencia:** [Repositorio Front-End \(commits\)](#)

Evidencias

Product Backlog

Herramienta Usada: Jira

Enlace Acceso:

<https://npc2025r3.atlassian.net/jira/software/projects/JJ/list?jql=project%20%3D%20JJ%20ORDER%20BY%20summary%20ASC%2C%20cf%5B10019%5D%20ASC>

Listado de Historias de Usuario Priorizadas

El Product Backlog de TallerControl contiene las historias de usuario que representan las necesidades funcionales del sistema de información para la gestión de un taller de mecánica de motocicletas. Las historias de usuario se organizan de acuerdo con los roles principales del sistema: Administrador, Empleado y Cliente. Estas permiten establecer las funcionalidades que serán desarrolladas durante los diferentes incrementos del proyecto.

Historias de Usuario – Incremento 1

HU-001: Registro de usuario

Historia de usuario: Como usuario, necesito registrarme en el sistema, con la finalidad de crear una cuenta y acceder a las funcionalidades disponibles de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- **Registro de datos obligatorios.** En caso de que un usuario desee crear una cuenta, cuando diligencie el formulario de registro, el sistema debe solicitar y validar los datos obligatorios.
- **Validación de información.** En caso de que el usuario ingrese información inválida o incompleta, cuando intente registrarse, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- **Creación de cuenta.** En caso de que los datos sean válidos, cuando el usuario confirme el registro, el sistema debe crear su cuenta correctamente.
- **Confirmación de registro.** En caso de que el registro sea exitoso, cuando finalice el proceso, el sistema debe informar al usuario que su cuenta fue creada.

HU-002: Inicio de sesión

Historia de usuario: Como usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- **Validación de credenciales.** En caso de que un usuario tenga una cuenta registrada, cuando ingrese sus credenciales, el sistema debe validar la información.

- **Acceso exitoso.** En caso de que las credenciales sean correctas, cuando el usuario inicie sesión, el sistema debe permitirle acceder a la plataforma.
- **Rechazo de credenciales inválidas.** En caso de que se ingresen datos incorrectos, cuando se intente iniciar sesión, el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de error.
- **Redirección según el rol.** En caso de que el usuario ingrese correctamente, cuando se complete la autenticación, el sistema debe dirigirlo a la interfaz correspondiente a su rol.

HU-004: Visualización de servicios disponibles

Historia de usuario: Como cliente, necesito visualizar los servicios disponibles del taller, con la finalidad de conocer las opciones de mantenimiento y reparación que puedo solicitar.

Criterios de aceptación:

- **Listado de servicios.** En caso de que el cliente ingrese al módulo de servicios, cuando cargue la pantalla, el sistema debe mostrar los servicios disponibles.
- **Visualización de información.** En caso de que el cliente consulte un servicio, cuando seleccione un registro, el sistema debe mostrar su nombre, descripción y precio.
- **Disponibilidad de servicios.** En caso de que un servicio esté disponible para ser solicitado, cuando el cliente consulte el listado, el sistema debe permitir visualizarlo.

- **Actualización de información.** En caso de que un administrador modifique un servicio, cuando el cliente consulte nuevamente el listado, el sistema debe mostrar la información actualizada.

HU-008: Creación de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito crear servicios de mantenimiento y reparación, con la finalidad de ofrecer y gestionar las opciones de atención del taller.

Criterios de aceptación:

- **Registro de servicio.** En caso de que el administrador desee agregar un servicio, cuando diligencie el formulario, el sistema debe permitir registrar la información requerida.
- **Validación de datos.** En caso de que el administrador ingrese datos incompletos, cuando intente guardar el servicio, el sistema debe validar la información y mostrar un mensaje.
- **Almacenamiento.** En caso de que los datos sean válidos, cuando se confirme el registro, el sistema debe guardar el nuevo servicio.
- **Visualización del servicio creado.** En caso de que el servicio haya sido registrado correctamente, cuando se consulte el listado, el sistema debe mostrar el nuevo servicio.

HU-009: Gestión de usuarios

Historia de usuario: Como administrador, necesito gestionar los usuarios del sistema, con la finalidad de mantener organizada la información de los clientes, empleados y administradores del taller. Criterios de aceptación:

- **Listado de usuarios.** En caso de que el administrador ingrese al módulo de usuarios, cuando cargue la pantalla, el sistema debe mostrar los usuarios registrados.
- **Consulta de información.** En caso de que el administrador seleccione un usuario, cuando consulte su registro, el sistema debe mostrar la información correspondiente.
- **Gestión de usuarios.** En caso de que el administrador necesite modificar la información de un usuario, cuando realice la actualización, el sistema debe guardar los cambios correctamente.

HU-010: Edición de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito editar la información de los servicios del taller, con la finalidad de mantener actualizados sus nombres, descripciones y precios.

Criterios de aceptación:

- **Selección de servicio.** En caso de que el administrador consulte los servicios registrados, cuando seleccione uno, el sistema debe permitir acceder a su información para editarla.
- **Actualización de datos.** En caso de que el administrador modifique la información de un servicio, cuando guarde los cambios, el sistema debe actualizar el registro.

- **Validación de información.** En caso de que se ingresen datos inválidos, cuando se intente guardar, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- **Visualización actualizada.** En caso de que la edición sea exitosa, cuando se consulte el listado, el sistema debe mostrar la información modificada.

HU-011: Desactivación de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito desactivar servicios que ya no se ofrecen en el taller, con la finalidad de evitar que aparezcan como disponibles para los clientes.

Criterios de aceptación:

- **Selección de servicio.** En caso de que el administrador consulte los servicios registrados, cuando seleccione uno, el sistema debe permitir desactivarlo.
- **Confirmación de desactivación.** En caso de que el administrador solicite desactivar un servicio, cuando confirme la acción, el sistema debe actualizar su estado.
- **Cambio de disponibilidad.** En caso de que un servicio haya sido desactivado, cuando el cliente consulte los servicios disponibles, el sistema no debe mostrarlo como disponible.
- **Conservación de información.** En caso de que un servicio sea desactivado, cuando el administrador consulte sus registros, el sistema debe conservar la información del servicio.

Priorización de las historias de usuario

Las historias de usuario fueron organizadas en Jira de acuerdo con las necesidades del proyecto y la planificación de los incrementos. Para el Sprint 2 – Incremento 1 se seleccionaron las historias relacionadas con autenticación, usuarios y servicios, como base para la primera versión funcional de TallerControl.

Figura 3. *Product Backlog completo del proyecto en Jira*

▼

Sprint 1 - Inicio

10 ago – 21 ago (9 actividades)

0

0

0

Completar sprint

...

Definir el alcance, problema, usuarios, requerimientos y criterios iniciales del proyecto para establecer la base del desarrollo.

☒	21 Definición del alcance del proyecto	Listo ▼	-	
☒	22 Identificación del problema	Listo ▼	-	
☒	23 Definición del objetivo y usuarios	Listo ▼	-	
☒	24 Recolección de información mediante encuesta	Listo ▼	-	
☒	25 Observación de los procesos del taller	Listo ▼	-	
☒	26 Identificación y clasificación de requerimientos	Listo ▼	-	
☒	27 Definición de requerimientos no funcionales	Listo ▼	-	
☒	28 Priorización de requerimientos	Listo ▼	-	
☒	29 Elaboración de historias de usuario	Listo ▼	-	

▼

Sprint 2 - Incremento 1

24 ago – 18 sep (15 actividades)

0

0

0

Completar sprint

...

Implementar las funcionalidades necesarias para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios ofrecidos por el taller, obteniendo una primera versión funcional del sistema.

☐	1 HU-001 - Registro de usuario	Listo ▼	-	
☐	2 HU-002 - Inicio de sesión	Listo ▼	-	
☐	4 HU-004 - Visualización de servicios disponibles	Listo ▼	-	
☐	9 HU-008 - Creación de servicios	Listo ▼	-	
☐	10 HU-009 - Gestión de usuarios	Listo ▼	-	
☐	11 HU-010 - Edición de servicios	Listo ▼	-	
☐	12 HU-011 - Desactivación de servicios	Listo ▼	-	
☒	30 Diseño de la base del sistema	Listo ▼	-	
☒	42 Configuración del proyecto	Listo ▼	-	
☒	43 Desarrollo del módulo de autenticación	Listo ▼	-	
☒	44 Desarrollo del módulo de usuarios	Listo ▼	-	
☒	45 Desarrollo del módulo de servicios	Listo ▼	-	
☒	46 Integración de módulos	Listo ▼	-	
☒	47 Pruebas del incremento	Listo ▼	-	
☒	48 Corrección de errores	Listo ▼	-	

☐ Sprint 3 - Incremento 2 21 sep – 16 oct (13 actividades)	000	Iniciar sprint	...
Implementar la gestión de motocicletas y el sistema de agendamiento de citas, permitiendo relacionar los vehículos de los clientes con los servicios solicitados.			
☐ JJ-3 HU-003 - Registro de motocicleta	Por hacer	-	
☐ JJ-6 HU-005 - Solicitud de cita	Por hacer	-	
☐ JJ-13 HU-012 - Gestión de citas	Por hacer	-	
☐ JJ-16 HU-015 - Visualización de citas programadas	Por hacer	-	
☐ JJ-17 HU-016 - Consulta de citas asignadas	Por hacer	-	
☐ JJ-18 HU-017 - Actualización del estado de la cita	Por hacer	-	
☒ JJ-49 Diseño de los módulos	Por hacer	-	
☒ JJ-50 Diseño de la estructura de motocicletas	Por hacer	-	
☒ JJ-51 Integración con clientes	Por hacer	-	
☒ JJ-52 Integración de motocicletas y citas	Por hacer	-	
☒ JJ-53 Validaciones del sistema	Por hacer	-	
☒ JJ-54 Pruebas del incremento	Por hacer	-	
☒ JJ-55 Corrección de errores	Por hacer	-	

☐ Sprint 4 - Incremento 3 19 oct – 13 nov (11 actividades)	000	Iniciar sprint	...
Incorporar las funcionalidades de control financiero, seguimiento de servicios e inventario, permitiendo ampliar la gestión operativa y administrativa del taller.			
☐ JJ-7 HU-006 - Consulta del estado de la cita	Por hacer	- =	
☐ JJ-8 HU-007 - Consulta del historial de citas	Por hacer	- =	
☐ JJ-14 HU-013 - Registro de movimientos financieros	Por hacer	- =	
☐ JJ-15 HU-014 - Consulta del historial de citas del taller	Por hacer	- =	
☐ JJ-19 HU-018 - Gestión de productos del inventario	Por hacer	- =	
☐ JJ-20 HU-019 - Registro de venta o uso de productos	Por hacer	- =	
☒ JJ-56 Diseño de los módulos	Por hacer	-	
☒ JJ-57 Integración con pedidos	Por hacer	-	
☒ JJ-58 Integración de inventario y stock	Por hacer	-	
☒ JJ-59 Pruebas del incremento	Por hacer	-	
☒ JJ-60 Corrección de errores	Por hacer	-	

☐ Sprint 5 - Cierre 16 nov – 27 nov (7 actividades)	000	Iniciar sprint	...
Integrar los módulos desarrollados, realizar las pruebas finales, corregir errores, completar la documentación y preparar la entrega del sistema TallerControl.			
☒ JJ-61 Integración general del sistema	Por hacer	-	
☒ JJ-62 Verificación de comunicación entre módulos	Por hacer	-	
☒ JJ-63 Pruebas generales	Por hacer	-	
☒ JJ-64 Corrección de errores finales	Por hacer	-	
☒ JJ-65 Documentación final	Por hacer	-	
☒ JJ-66 Validación final del sistema	Por hacer	-	
☒ JJ-67 Entrega del proyecto	Por hacer	-	

Entregable de Valor

Descripción del incremento. Se consolidaron los repositorios en GitHub con la estructura de arquitectura hexagonal (C# con ASP.NET core) y el proyecto Frontend Angular 21 organizado por módulos. La base de datos SQL Server está modelada hasta la tercera forma normal (3FN). Se cuenta con el diagrama entidad-relación de los módulos principales y con interfaces visuales completas del login y del dashboard de los 3 tipos de roles disponibles.

Enlaces de Evidencia Directa de Trabajo Autónomo

Repositorio Frontend: https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Frontend

Repositorio Backend: https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Backend

Figura 4. Diagrama ER

