

Informe de Seguimiento Ágil e Iteraciones

Jahidem I. Cobos y Sammy J. Arce

Universidad de Cundinamarca

Facultad de Ingeniería, Ingeniería de Sistema y Computación

Ingeniería de Software II, 601M

Ing. German Ortiz

Fusagasugá, Cundinamarca

26 de Septiembre de 2026

Equipo y Roles (Scrum Framework)

Sammy Josue Arce – delegado como **Producto Owner**, se encarga de las historias de usuario, validar criterios de aceptación de cada módulo. y priorizar el Product Backlog

Scrum Máster: Jahidem Ignacio Cobos – delegado como **Scrum Master**, se encarga de las reuniones, asegurar el uso correcto de herramientas como Jira, GitHub, Whatsapp y eliminar impedimentos.

Equipo de Desarrollo (Developers):

- **Jahidem Ignacio Cobos** - Frontend en angular 21.
- **Sammy Josue Arce** – Backend en C# con ASP.NET core.

Herramientas para la Gestión y Comunicación

- **Gestión del proyecto (tablero Scrum):** Jira.
- **Enlace al tablero:**
<https://npc2025r3.atlassian.net/jira/software/projects/JJ/boards/2/backlog>
- **Repositorio de código (Frontend):**
https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Frontend
- **Repositorio de código (Backend):**
https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Backend
- **Planeación temporal:** ProjectLibre — cronograma general con hitos (metodología Incremental para la línea base y Scrum para la ejecución).
- **Comunicación centralizada:** WhatsApp.

Historial de Iteraciones (Sprints)

Sprint 1 – Inicio

- Actividades establecidas: 9
- Fecha: 10 de agosto – 21 de agosto de 2026

Objetivo del sprint

Establecer una base clara para el desarrollo de TallerControl por medio de su alcance, problema, usuarios involucrados, requerimientos y criterios iniciales del proyecto.

Iteración 1: Inicio y levantamiento de requerimientos

Periodo: 10 al 21 de agosto de 2026 (Sprint 1). **Estado:** Completada.

Descripción de la Iteración 1

Objetivo de la iteración: Para desarrollar el sistema de gestión de información se debe definir el alcance que tiene el sistema, así como los usuarios involucrados, para así identificar la problemática, clasificar y priorizar todos los requerimientos necesarios para el sistema

Descripción del trabajo realizado: Se estableció un alcance adecuado y lógico para el sistema, además de identificar el problema relacionado con la gestión de los procesos llevado a cabo en el taller. También se recolectó la información suficiente y pertinente por medio de encuestas y observación de los procesos del taller. Gracias a esta información recopilada, se logró clasificar cada requerimiento funcional y no funcional y así priorizar las historias de usuario bases para el desarrollo de TallerControl.

Resultado del incremento: Se obtuvo una base de requerimientos y planificación para el proyecto, incluyendo la definición del alcance, la identificación de la problemática, los usuarios,

los requerimientos funcionales y no funcionales, la priorización y las historias de usuario iniciales del sistema.

Evidencia de Reuniones (Sincrónicas y Asincrónicas)


Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 1	ProjectLibre / Jira	Objetivo: establecer el alcance, identificar el problema en los talleres de motocicletas y organizar las actividades a realizar en el sprint. Acuerdos: Elaborar las historias de usuario del proyecto junto con los objetivos, requerimientos y usuarios.	
Daily Scrum	WhatsApp	Qué se hizo: Se recolecto la información por medio de una encuesta y observación de los procesos del taller. Además, se identificó el problema y se avanzó en la definición de alcance. Qué se hará: Completar las historias de usuario una vez se hayan clasificado y priorizado los requerimientos Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira	Review: Se revisaron los resultados de la recolección de la información, se identificaron requerimientos para la elaboración de las historia de usuario. Qué funcionó: Se organizo la información para el proyecto y se estableció una base sólida para el desarrollo de este. Por mejorar: Establecer una mejor aproximación de tiempos y las actividades del siguiente sprint.	

Figura 1. Evidencia Sprint y tareas en JIRA

☐ **Sprint 1 - Inicio** 10 ago – 21 ago (9 actividades)

000Completar sprint...

Definir el alcance, problema, usuarios, requerimientos y criterios iniciales del proyecto para establecer la base del desarrollo.

☒ JJ-21	Definición del alcance del proyecto	Listo ▾	-	
☒ JJ-22	Identificación del problema	Listo ▾	-	
☒ JJ-23	Definición del objetivo y usuarios	Listo ▾	-	
☒ JJ-24	Recolección de información mediante encuesta	Listo ▾	-	
☒ JJ-25	Observación de los procesos del taller	Listo ▾	-	
☒ JJ-26	Identificación y clasificación de requerimientos	Listo ▾	-	
☒ JJ-27	Definición de requerimientos no funcionales	Listo ▾	-	
☒ JJ-28	Priorización de requerimientos	Listo ▾	-	
☒ JJ-29	Elaboración de historias de usuario	Listo ▾	-	

Tabla 1. Trabajo realizado del sprint 1

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
Definir el alcance del proyecto	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificar el problema	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Definir el objetivo y usuarios	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Recolectar información mediante encuesta	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Observar los procesos del taller	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Identificar y clasificar los requerimientos	Sammy Arce	Hecho (Done)
Definir requerimientos no funcionales	Sammy Arce	Hecho (Done)
Priorizar los requerimientos	Sammy Arce	Hecho (Done)
Elaborar historias de usuario	Sammy Arce	Hecho (Done)

Sprint 2 – Incremento 1

- 15 actividades

- 24 de agosto – 18 de septiembre de 2026

Objetivo del sprint

Con el objetivo de obtener una primera versión funcional de sistema, se busca implementar las funcionalidades requeridas para poder gestionar el acceso a la plataforma, servicios del taller y usuarios del sistema,

Iteración 2: Incremento 1 – Autenticación, usuarios y servicios

Periodo: 24 de agosto al 18 de septiembre de 2026 (Sprint 2). **Estado:** Completada.

Descripción de la Iteración 2

Objetivo de la iteración: Por medio del diseño de la base de datos, la implementación y funcionamiento de los módulos de autenticación de usuario y el desarrollo de cada funcionalidad de los usuarios y servicios se busca desarrollar la primera versión funcional de TallerControl.

Descripción del trabajo realizado: Se desarrolló, como primer incremento, los usuarios, el correcto acceso a la plataforma y los servicios del taller. Además, se desarrollaron los módulos de autenticación, usuarios y servicios, esto teniendo en cuenta el diseño realizado para la base de datos y la configuración para el proyecto. Esto se llevó a cabo por medio de las tecnologías elegidas para el proyecto. Las historias de usuario trabajadas en este incremento fueron:

- HU-001: Registro de usuario.
- HU-002: Inicio de sesión.
- HU-004: Visualización de servicios disponibles.
- HU-008: Creación de servicios.
- HU-009: Gestión de usuarios.
- HU-010: Edición de servicios.

- HU-011: Desactivación de servicios.

Además, se realizó la integración de módulos, las pruebas de estos y la corrección de errores. Estas actividades verificaron que el funcionamiento de lo realizado consolidara el primer incremento del sistema.

Resultado del incremento: Como resultado del Sprint 2 – Incremento 1, se obtuvo una primera versión funcional de TallerControl, con funcionalidades orientadas a:


- Gestionar el registro y acceso de los usuarios mediante el módulo de autenticación.
- Administrar los usuarios del sistema.
- Visualizar y gestionar los servicios ofrecidos por el taller.
- Integrar los módulos desarrollados.
- Ejecutar las pruebas y realizar la corrección de errores correspondientes.

El incremento representa un avance en la construcción del sistema de información para la gestión del taller de mecánica de motocicletas, permitiendo disponer de una base funcional para el desarrollo de los siguientes módulos y funcionalidades del proyecto.

Evidencia de Reuniones

Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 2	Jira	Objetivo: Planificar el desarrollo del primer incremento de TallerControl. Acuerdos: Desarrollar las funcionalidades de autenticación, usuarios y servicios, junto con las actividades de configuración, integración y pruebas.	
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se realizó la configuración del proyecto, diseño de la base de datos y desarrollo de los módulos de autenticación, usuarios y servicios. Qué se hará: Se completaron las actividades de integración, pruebas del incremento y corrección de errores. Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron las funcionalidades desarrolladas de autenticación, usuarios y servicios, así como la integración, pruebas y corrección de errores. Qué funcionó: La organización del trabajo por módulos y el seguimiento de actividades en Jira. Por mejorar: Mejorar la estimación de tiempos y la validación de criterios de aceptación para los siguientes incrementos.	

Figura 2. Evidencia Sprint y tareas en JIRA

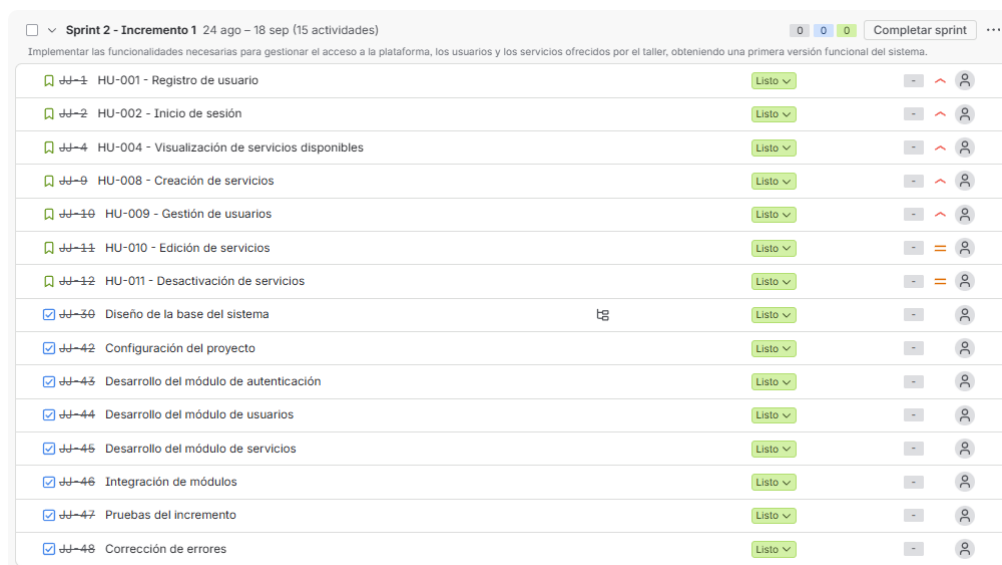

☐ Sprint 2 - Incremento 1 24 ago - 18 sep (15 actividades)	Completar sprint
Implementar las funcionalidades necesarias para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios ofrecidos por el taller, obteniendo una primera versión funcional del sistema.	
📌 HU-001 - Registro de usuario	Listo
📌 HU-002 - Inicio de sesión	Listo
📌 HU-004 - Visualización de servicios disponibles	Listo
📌 HU-008 - Creación de servicios	Listo
📌 HU-009 - Gestión de usuarios	Listo
📌 HU-010 - Edición de servicios	Listo
📌 HU-011 - Desactivación de servicios	Listo
📌 Diseño de la base del sistema	Listo
📌 Configuración del proyecto	Listo
📌 Desarrollo del módulo de autenticación	Listo
📌 Desarrollo del módulo de usuarios	Listo
📌 Desarrollo del módulo de servicios	Listo
📌 Integración de módulos	Listo
📌 Pruebas del incremento	Listo
📌 Corrección de errores	Listo

Tabla 2. Trabajo realizado del sprint 2

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
HU-001 – Registro de usuario	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-002 – Inicio de sesión	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-004 – Visualización de servicios disponibles	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-008 – Creación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-009 – Gestión de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-010 – Edición de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-011 – Desactivación de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la base del sistema	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Configuración del proyecto	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de autenticación	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de usuarios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Desarrollo del módulo de servicios	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de módulos	Jahidem Cobos	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

Iteración 3: Incremento 2 – Motocicletas y Gestión de Citas

Periodo: 21 de septiembre al 16 de octubre de 2026 (Sprint 3). **Estado:** Completada.

Descripción de la Iteración 3

Objetivo de la iteración: Relacionar los vehículos de los clientes con los servicios solicitados a través de la implementación del sistema de gestión de motocicletas y agendamiento de citas.

Descripción del trabajo realizado: La gestión de motocicletas, el proceso de agendamiento y la administración de citas del taller fueron las actividades a desarrollar para que el segundo incremento funcional de sistema fuera desarrollado. Se desarrolló el diseño de los módulos, estructuración de la información relacionada con las motocicletas, integración de estas con los clientes y relación entre motocicletas y sus citas. Además, las funcionalidades para la solicitud, gestión, consulta y actualización del estado de las citas también fueron hechas e integradas con el resto del sistema.

Las historias de usuario trabajadas en este incremento fueron:

- HU-003: Registro de motocicleta.
- HU-005: Solicitud de cita.
- HU-012: Gestión de citas.
- HU-015: Visualización de citas programadas.
- HU-016: Consulta de citas asignadas.

Además, las actividades relacionadas con el diseño de los módulos, el diseño de la estructura de motocicletas, la integración con los clientes, la integración de motocicletas y citas, las validaciones del sistema, las pruebas del incremento y la corrección de errores permitieron

verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades para consolidar el segundo incremento funcional del sistema.

Resultado del incremento: Como resultado, se obtuvo un incremento funcional de TallerControl, con funcionalidades orientadas a:

- Registrar las motocicletas asociadas a los clientes.
- Permitir a los clientes realizar solicitudes de citas.
- Gestionar las citas registradas en el sistema.
- Visualizar las citas programadas.
- Consultar las citas asignadas al personal correspondiente.
- Actualizar el estado de las citas durante el proceso de atención.
- Relacionar los clientes con sus motocicletas y las citas solicitadas.

El incremento representa un avance en la construcción del sistema de información para la gestión del taller de mecánica de motocicletas, permitiendo ampliar las funcionalidades de TallerControl mediante la incorporación de la gestión de vehículos y del proceso de agendamiento y seguimiento de citas.

Evidencia de Reuniones


Reunión	Herramienta	Objetivo y acuerdos	Evidencia (captura/link)
Sprint Planning 3	Jira	Objetivo: Planificar el desarrollo del segundo incremento de TallerControl. Acuerdos: Desarrollar las funcionalidades de registro de motocicletas, solicitud y gestión de citas, consulta de citas y actualización de su estado, esto ligado con las actividades de diseño, integración, validación y pruebas.	 The screenshot shows a Jira board titled 'Sprint 3: Incremento 2 (8 sep - 16 oct (10 días))'. It lists several tasks with their status (To Do, In Progress, Done) and assignees. The tasks include: 'Implementar y probar la funcionalidad de registro de motocicletas', 'Implementar y probar la funcionalidad de solicitud de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de gestión de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de consulta de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de actualización de estado de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de motocicletas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de estado de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de estado de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de estado de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de estado de citas', 'Implementar y probar la funcionalidad de integración de estado de citas'.
Daily Scrum (asincrónico)	WhatsApp	Qué se hizo: Se diseñó los módulos, se desarrolló de la estructura de motocicletas, se integró con los clientes. Qué se hará: Se completaron las actividades de integración, validación, pruebas del incremento y corrección de errores. Impedimentos: Ninguno.	
Sprint Review y Retrospective	Jira / WhatsApp	Review: Se revisaron las funcionalidades desarrolladas para la gestión de motocicletas y citas, así como su integración, validación, pruebas y corrección de errores. Qué funcionó: La integración de las funcionalidades de motocicletas y citas con los módulos existentes y el seguimiento de las actividades mediante Jira. Por mejorar: Mejorar la planificación de las actividades de integración y realizar las validaciones de las funcionalidades en etapas más tempranas del desarrollo.	

Figura 3. Evidencia Sprint y tareas en JIRA

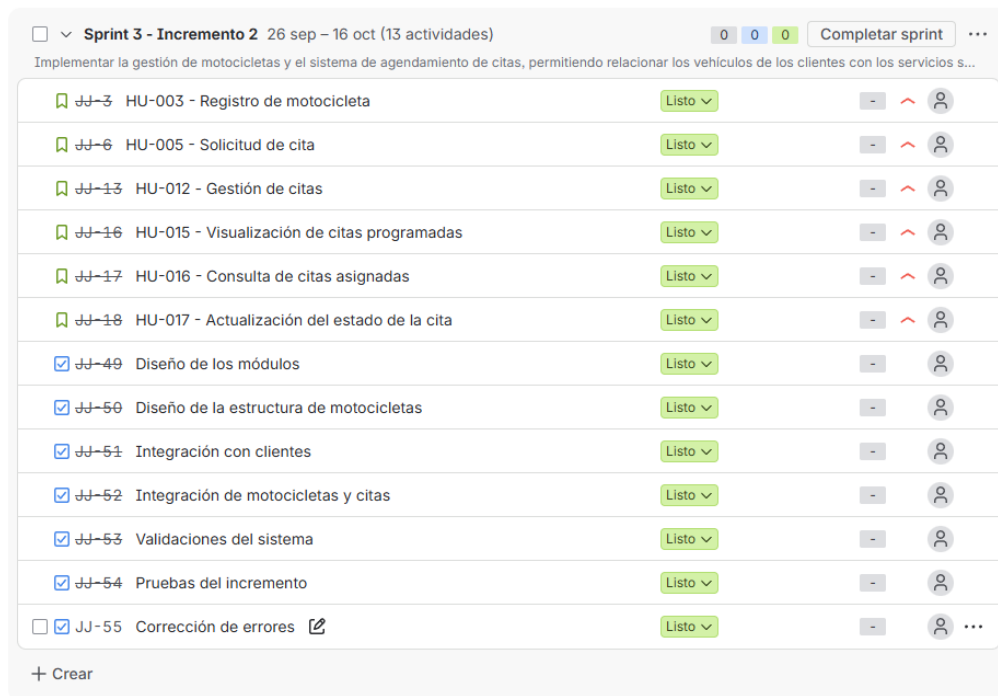


Tabla 3. Trabajo realizado del sprint 2

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
HU-003 – Registro de motocicleta	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-005 – Solicitud de cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-012 – Gestión de citas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-015 – Visualización de citas programadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-016 – Consulta de citas asignadas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
HU-017 – Actualización del estado de la cita	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de los módulos	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Diseño de la estructura de motocicletas	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración con clientes	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)
Integración de motocicletas y citas	Jahidem Cobos	Hecho (Done)

Tarea (User Story / Task)	Responsable asignado	Estado actual
Validaciones del sistema	Sammy Arce	Hecho (Done)
Pruebas del incremento	Sammy Arce	Hecho (Done)
Corrección de errores	Jahidem Cobos y Sammy Arce	Hecho (Done)

Matriz de Trabajo Autónomo y Evidencias Directas

Para demostrar el trabajo individual y la autonomía de cada integrante, se consolida el registro de commits, ediciones y tareas completadas:

- **Sammy Arce**
 - Modelado del diagrama entidad-relación y de la base de datos SQL Server (3FN), y configuración de la arquitectura hexagonal del backend.
 - **Evidencia:** [Repositorio Back-End \(commits\)](#)
- **Jahidem Cobos**
 - Estructura de componentes standalone y signals en Angular, construcción del dashboard por roles e interfaces completas de módulos realizados, conexión con la API del backend.
 - **Evidencia:** [Repositorio Front-End \(commits\)](#)

Evidencias

Product Backlog

Herramienta Usada: Jira

Enlace Acceso:

<https://npc2025r3.atlassian.net/jira/software/projects/JJ/list?jql=project%20%3D%20JJ%20ORDER%20BY%20summary%20ASC%2C%20cf%5B10019%5D%20ASC>

Listado de Historias de Usuario Priorizadas

En el Product Backlog yacen las historias de usuario representando las necesidades funcionales del sistema de información para la gestión del taller. Las historias de usuario, según los roles establecidos para el sistema, fueron organizadas en función a estos. Estas permiten establecer las funcionalidades que serán desarrolladas durante los diferentes incrementos del proyecto.

Historias de Usuario – Incremento 1

HU-001: Registro de usuario

Historia de usuario: Como usuario, necesito registrarme en el sistema, con la finalidad de crear una cuenta y acceder a las funcionalidades disponibles de la plataforma.

Criterios de aceptación:

- **Registro de datos obligatorios.** En caso de que un usuario desee crear una cuenta, cuando diligencie el formulario de registro, el sistema debe solicitar y validar los datos obligatorios.
- **Validación de información.** si el usuario ingresa información inválida o incompleta, cuando intente registrarse, el sistema debe mostrara un mensaje de error.
- **Creación de cuenta.** En caso de que los datos sean válidos, cuando el usuario confirme el registro, el sistema debe crear su cuenta correctamente.

- **Confirmación de registro.** si el registro es exitoso, cuando finalice el proceso, el sistema informara al usuario que su cuenta fue creada.

HU-002: Inicio de sesión

Historia de usuario: Como usuario registrado, necesito iniciar sesión en la plataforma, con la finalidad de acceder a las funcionalidades correspondientes a mi rol dentro del sistema.

Criterios de aceptación:

- **Validación de credenciales.** En caso de que un usuario tenga una cuenta registrada, cuando ingrese sus credenciales, el sistema debe validar la información.
- **Acceso exitoso.** En caso de que las credenciales sean correctas, cuando el usuario inicie sesión, el sistema debe permitirle acceder a la plataforma.
- **Rechazo de credenciales inválidas.** En caso de que se ingresen datos incorrectos, cuando se intente iniciar sesión, el sistema debe denegar el acceso y mostrar un mensaje de error.
- **Redirección según el rol.** En caso de que el usuario ingrese correctamente, cuando se complete la autenticación, el sistema debe dirigirlo a la interfaz correspondiente a su rol.

HU-004: Visualización de servicios disponibles

Historia de usuario: Como cliente, necesito visualizar los servicios disponibles del taller, con la finalidad de conocer las opciones de mantenimiento y reparación que puedo solicitar.

Criterios de aceptación:

- **Listado de servicios.** En caso de que el cliente ingrese al módulo de servicios, cuando cargue la pantalla, el sistema debe mostrar los servicios disponibles.
- **Visualización de información.** En caso de que el cliente consulte un servicio, cuando seleccione un registro, el sistema debe mostrar su nombre, descripción y precio.
- **Disponibilidad de servicios.** En caso de que un servicio esté disponible para ser solicitado, cuando el cliente consulte el listado, el sistema debe permitir visualizarlo.
- **Actualización de información.** En caso de que un administrador modifique un servicio, cuando el cliente consulte nuevamente el listado, el sistema debe mostrar la información actualizada.

HU-008: Creación de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito crear servicios de mantenimiento y reparación, con la finalidad de ofrecer y gestionar las opciones de atención del taller.

Criterios de aceptación:

- **Registro de servicio.** En caso de que el administrador desee agregar un servicio, cuando diligencie el formulario, el sistema debe permitir registrar la información requerida.
- **Validación de datos.** En caso de que el administrador ingrese datos incompletos, cuando intente guardar el servicio, el sistema debe validar la información y mostrar un mensaje.

- **Almacenamiento.** En caso de que los datos sean válidos, cuando se confirme el registro, el sistema debe guardar el nuevo servicio.
- **Visualización del servicio creado.** En caso de que el servicio haya sido registrado correctamente, cuando se consulte el listado, el sistema debe mostrar el nuevo servicio.

HU-009: Gestión de usuarios

Historia de usuario: Como administrador, necesito gestionar los usuarios del sistema, con la finalidad de mantener organizada la información de los clientes, empleados y administradores del taller. Criterios de aceptación:

- **Listado de usuarios.** En caso de que el administrador ingrese al módulo de usuarios, cuando cargue la pantalla, el sistema debe mostrar los usuarios registrados.
- **Consulta de información.** En caso de que el administrador seleccione un usuario, cuando consulte su registro, el sistema debe mostrar la información correspondiente.
- **Gestión de usuarios.** En caso de que el administrador necesite modificar la información de un usuario, cuando realice la actualización, el sistema debe guardar los cambios correctamente.

HU-010: Edición de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito editar la información de los servicios del taller, con la finalidad de mantener actualizados sus nombres, descripciones y precios.

Criterios de aceptación:

- **Selección de servicio.** En caso de que el administrador consulte los servicios registrados, cuando seleccione uno, el sistema debe permitir acceder a su información para editarla.
- **Actualización de datos.** En caso de que el administrador modifique la información de un servicio, cuando guarde los cambios, el sistema debe actualizar el registro.
- **Validación de información.** En caso de que se ingresen datos inválidos, cuando se intente guardar, el sistema debe mostrar un mensaje de error.
- **Visualización actualizada.** En caso de que la edición sea exitosa, cuando se consulte el listado, el sistema debe mostrar la información modificada.

HU-011: Desactivación de servicios

Historia de usuario: Como administrador, necesito desactivar servicios que ya no se ofrecen en el taller, con la finalidad de evitar que aparezcan como disponibles para los clientes.

Criterios de aceptación:

- **Selección de servicio.** En caso de que el administrador consulte los servicios registrados, cuando seleccione uno, el sistema debe permitir desactivarlo.
- **Confirmación de desactivación.** En caso de que el administrador solicite desactivar un servicio, cuando confirme la acción, el sistema debe actualizar su estado.

- **Cambio de disponibilidad.** En caso de que un servicio haya sido desactivado, cuando el cliente consulte los servicios disponibles, el sistema no debe mostrarlo como disponible.
- **Conservación de información.** En caso de que un servicio sea desactivado, cuando el administrador consulte sus registros, el sistema debe conservar la información del servicio.

Historias de Usuario – Incremento 2

HU-003: Registro de motocicleta

Historia de usuario: Como cliente, necesito registrar mi motocicleta, con la finalidad de poder solicitar servicios.

Criterios de aceptación:

- **Ingreso de datos.** En caso de que el cliente desee registrar una motocicleta, cuando ingrese la información solicitada, el sistema debe permitir registrar la información correspondiente.
- **Validación de campos obligatorios.** En caso de que existan campos sin completar, cuando el cliente intente guardar el registro, el sistema debe solicitar completar la información faltante.
- **Almacenamiento de la motocicleta.** En caso de que la información ingresada sea válida, cuando el cliente confirme el registro, el sistema debe almacenar la información de la motocicleta.

- **Confirmación de registro.** En caso de que el registro haya sido creado correctamente, cuando finalice el proceso, el sistema debe mostrar un mensaje de registro exitoso.

HU-005: Solicitud de cita

Historia de usuario: Como cliente, necesito solicitar una cita, con la finalidad de recibir un servicio.

Criterios de aceptación:

- **Selección de servicio, motocicleta y fecha.** En caso de que el cliente desee solicitar un servicio, cuando complete los datos de la cita, el sistema debe registrar la información seleccionada.
- **Validación de disponibilidad.** En caso de que el cliente haya seleccionado una fecha y hora, cuando solicite la cita, el sistema debe verificar la disponibilidad del horario.
- **Registro de la solicitud.** En caso de que la fecha seleccionada esté disponible, cuando el cliente confirme la solicitud, el sistema debe registrar la cita correctamente.

HU-012: Gestión de citas

Historia de usuario: Como administrador, necesito gestionar citas, con la finalidad de organizar los servicios.

Criterios de aceptación:

- **Visualización de solicitudes.** En caso de que existan citas registradas, cuando el administrador acceda al módulo de citas, el sistema debe mostrar todas las solicitudes.
- **Modificación de citas.** En caso de que exista una cita programada, cuando el administrador realice cambios, el sistema debe actualizar la información de la cita.

HU-015: Visualización de citas programadas

Historia de usuario: Como administrador, necesito ver citas programadas, con la finalidad de planificar el trabajo.

Criterios de aceptación:

- **Consulta de citas.** En caso de que existan citas programadas en el sistema, cuando el administrador acceda al módulo de citas, el sistema debe mostrar la lista de citas registradas.
- **Visualización del detalle de la cita.** En caso de que exista una cita programada, cuando el administrador seleccione una cita específica, el sistema debe mostrar la fecha, hora, cliente, motocicleta, servicio solicitado y demás información asociada a la cita.
- **Ordenamiento de citas.** En caso de que existan múltiples citas registradas, cuando el administrador consulte la agenda, el sistema debe mostrar las citas ordenadas por fecha y hora.

HU-016: Consulta de servicios asignados

Historia de usuario: Como empleado, necesito ver servicios asignados, con la finalidad de realizar el trabajo.

Criterios de aceptación:

- **Consulta de servicios asignados.** En caso de que el empleado tenga servicios asignados, cuando acceda al listado de trabajo, el sistema debe mostrar los servicios asignados al empleado.
- **Consulta del detalle del servicio.** En caso de que exista un servicio asignado al empleado, cuando seleccione un servicio específico, el sistema debe mostrar la motocicleta, descripción del servicio, fecha asignada, estado y demás información relacionada.

HU-017: Actualización del estado del servicio

Historia de usuario: Como empleado, necesito actualizar el estado del servicio, con la finalidad de reflejar el progreso.

Criterios de aceptación:

- **Actualización del estado del servicio.** En caso de que el servicio se encuentre en ejecución, cuando el empleado modifique el estado del servicio, el sistema debe permitir cambiar el estado entre **Pendiente, En proceso y Finalizado**.
- **Guardado de cambios.** En caso de que se haya realizado una modificación del estado, cuando el empleado confirme la actualización, el sistema debe guardar correctamente los cambios realizados.

Priorización de las historias de usuario

Las historias de usuario se organizaron en la herramienta Jira de acuerdo con las necesidades del proyecto y la planificación de los incrementos. Para el Sprint 2 – Incremento 1 se seleccionaron las historias relacionadas con autenticación, usuarios y servicios, como base para la primera versión funcional de TallerControl.

Figura 3. *Product Backlog completo del proyecto en Jira*

☐ Sprint 1 - Inicio 10 ago – 21 ago (9 actividades)					0	0	0	Completar sprint	...
Definir el alcance, problema, usuarios, requerimientos y criterios iniciales del proyecto para establecer la base del desarrollo.									
☒	jj-21	Definición del alcance del proyecto	Listo	-					
☒	jj-22	Identificación del problema	Listo	-					
☒	jj-23	Definición del objetivo y usuarios	Listo	-					
☒	jj-24	Recolección de información mediante encuesta	Listo	-					
☒	jj-25	Observación de los procesos del taller	Listo	-					
☒	jj-26	Identificación y clasificación de requerimientos	Listo	-					
☒	jj-27	Definición de requerimientos no funcionales	Listo	-					
☒	jj-28	Priorización de requerimientos	Listo	-					
☒	jj-29	Elaboración de historias de usuario	Listo	-					

☐ Sprint 2 - Incremento 1 24 ago – 18 sep (15 actividades)					0	0	0	Completar sprint	...
Implementar las funcionalidades necesarias para gestionar el acceso a la plataforma, los usuarios y los servicios ofrecidos por el taller, obteniendo una primera versión funcional del sistema.									
☐	jj-1	HU-001 - Registro de usuario	Listo	-	^				
☐	jj-2	HU-002 - Inicio de sesión	Listo	-	^				
☐	jj-4	HU-004 - Visualización de servicios disponibles	Listo	-	^				
☐	jj-9	HU-008 - Creación de servicios	Listo	-	^				
☐	jj-10	HU-009 - Gestión de usuarios	Listo	-	^				
☐	jj-11	HU-010 - Edición de servicios	Listo	-	=				
☐	jj-12	HU-011 - Desactivación de servicios	Listo	-	=				
☒	jj-30	Diseño de la base del sistema	Listo	-					
☒	jj-42	Configuración del proyecto	Listo	-					
☒	jj-43	Desarrollo del módulo de autenticación	Listo	-					
☒	jj-44	Desarrollo del módulo de usuarios	Listo	-					
☒	jj-45	Desarrollo del módulo de servicios	Listo	-					
☒	jj-46	Integración de módulos	Listo	-					
☒	jj-47	Pruebas del incremento	Listo	-					
☒	jj-48	Corrección de errores	Listo	-					

☐ **Sprint 3 - Incremento 2** 21 sep – 16 oct (13 actividades)

0 0 0

Iniciar sprint



Implementar la gestión de motocicletas y el sistema de agendamiento de citas, permitiendo relacionar los vehículos de los clientes con los servicios solicitados.

☐ JJ-3	HU-003 - Registro de motocicleta	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☐ JJ-6	HU-005 - Solicitud de cita	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☐ JJ-13	HU-012 - Gestión de citas	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☐ JJ-16	HU-015 - Visualización de citas programadas	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☐ JJ-17	HU-016 - Consulta de citas asignadas	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☐ JJ-18	HU-017 - Actualización del estado de la cita	Por hacer ▾	-	⬆	👤
☒ JJ-49	Diseño de los módulos	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-50	Diseño de la estructura de motocicletas	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-51	Integración con clientes	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-52	Integración de motocicletas y citas	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-53	Validaciones del sistema	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-54	Pruebas del incremento	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-55	Corrección de errores	Por hacer ▾	-		👤

☐ **Sprint 4 - Incremento 3** 19 oct – 13 nov (11 actividades)

0 0 0

Iniciar sprint



Incorporar las funcionalidades de control financiero, seguimiento de servicios e inventario, permitiendo ampliar la gestión operativa y administrativa del taller.

☐ JJ-7	HU-006 - Consulta del estado de la cita	Por hacer ▾	-	=	👤
☐ JJ-8	HU-007 - Consulta del historial de citas	Por hacer ▾	-	=	👤
☐ JJ-14	HU-013 - Registro de movimientos financieros	Por hacer ▾	-	=	👤
☐ JJ-15	HU-014 - Consulta del historial de citas del taller	Por hacer ▾	-	=	👤
☐ JJ-19	HU-018 - Gestión de productos del inventario	Por hacer ▾	-	=	👤
☐ JJ-20	HU-019 - Registro de venta o uso de productos	Por hacer ▾	-	=	👤
☒ JJ-56	Diseño de los módulos	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-57	Integración con pedidos	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-58	Integración de inventario y stock	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-59	Pruebas del incremento	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-60	Corrección de errores	Por hacer ▾	-		👤

☐ **Sprint 5 - Cierre** 16 nov – 27 nov (7 actividades)

0 0 0

Iniciar sprint



Integrar los módulos desarrollados, realizar las pruebas finales, corregir errores, completar la documentación y preparar la entrega del sistema TallerControl.

☒ JJ-61	Integración general del sistema	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-62	Verificación de comunicación entre módulos	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-63	Pruebas generales	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-64	Corrección de errores finales	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-65	Documentación final	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-66	Validación final del sistema	Por hacer ▾	-		👤
☒ JJ-67	Entrega del proyecto	Por hacer ▾	-		👤

Entregable de Valor


Descripción del incremento. Se consolidaron los repositorios en GitHub con la estructura de arquitectura hexagonal (C# con ASP.NET core) y el proyecto Frontend Angular 21 organizado por módulos. La base de datos SQL Server está modelada hasta la tercera forma normal (3FN). Se cuenta con el diagrama entidad-relación de los módulos principales y con interfaces visuales completas del login y del dashboard de los 3 tipos de roles disponibles.

Enlaces de Evidencia Directa de Trabajo Autónomo

Repositorio Frontend: https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Frontend

Repositorio Backend: https://github.com/jahidemcob/TallerControl_Backend

Figura 4. Diagrama ER

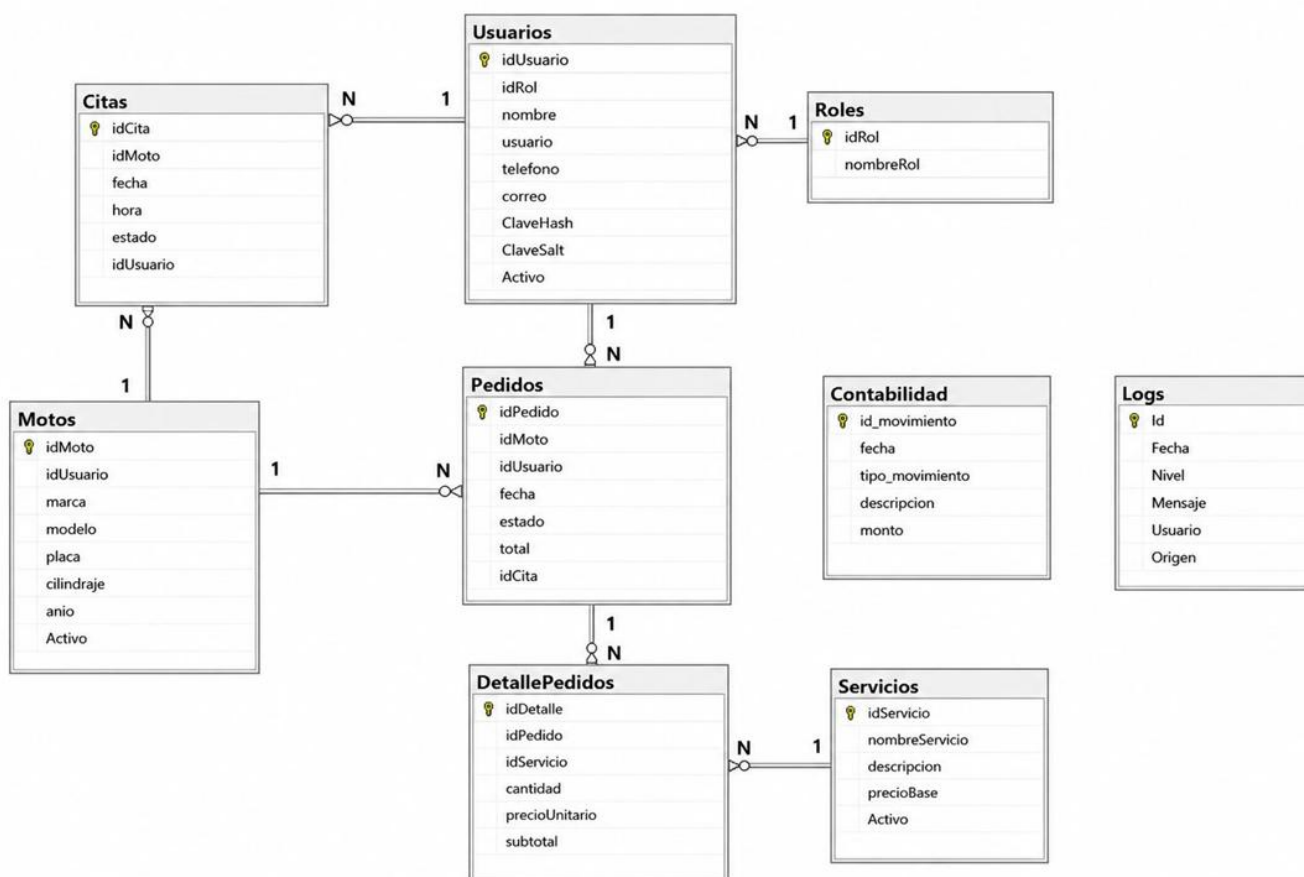

Evidencias de Sistema Funcionando

Se agregan capturas del sistema funcionando, específicamente se las pantallas del frontend, con las que interactúan los distintos tipos de usuario en el software.

Figura 5. Login

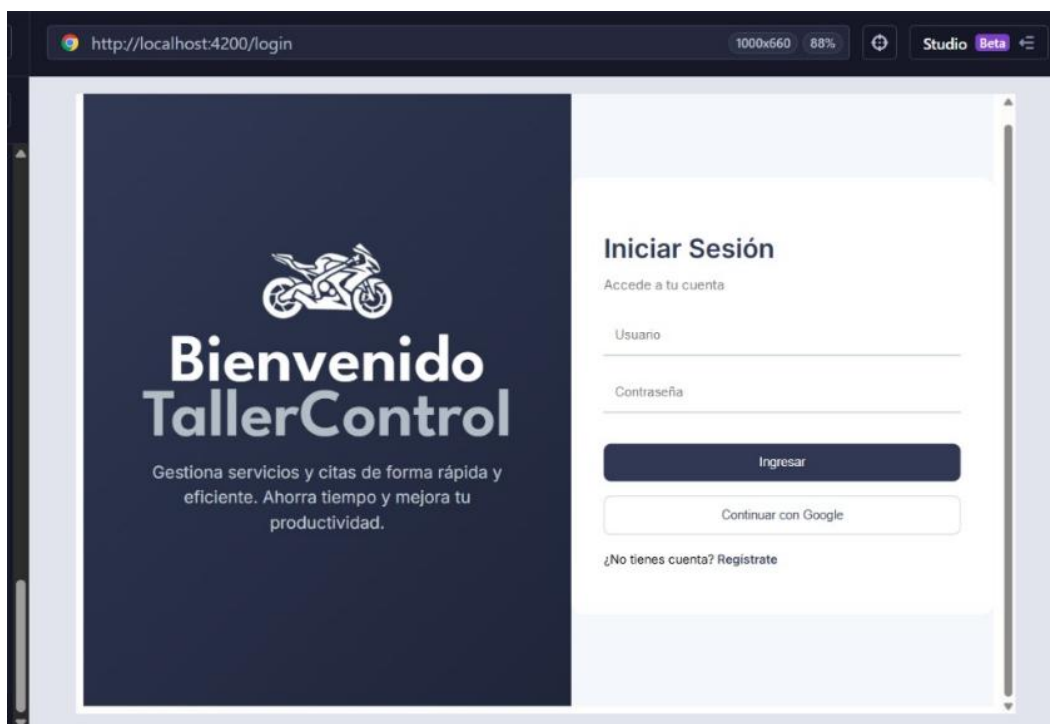


Figura 6. Registro

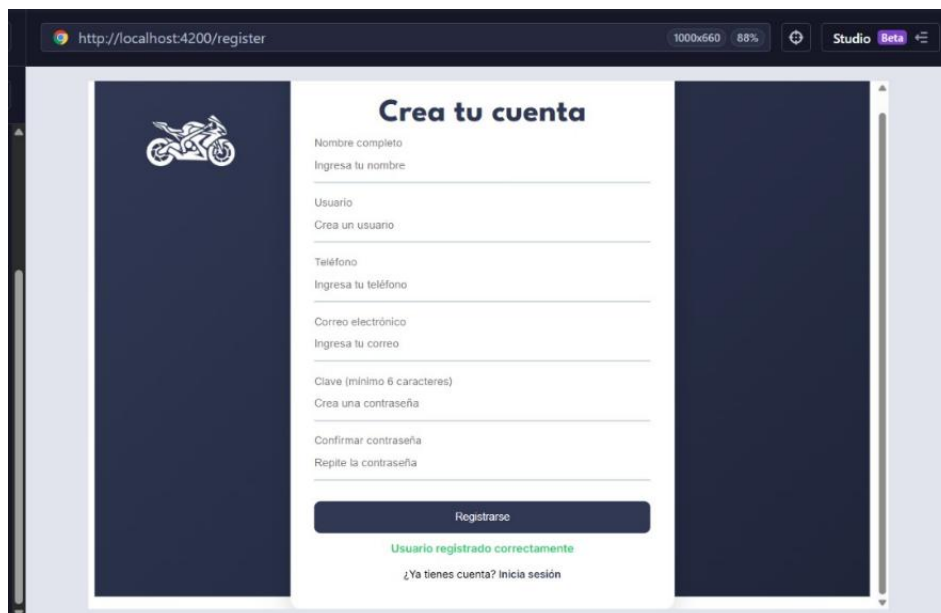


Figura 7. Modulo users

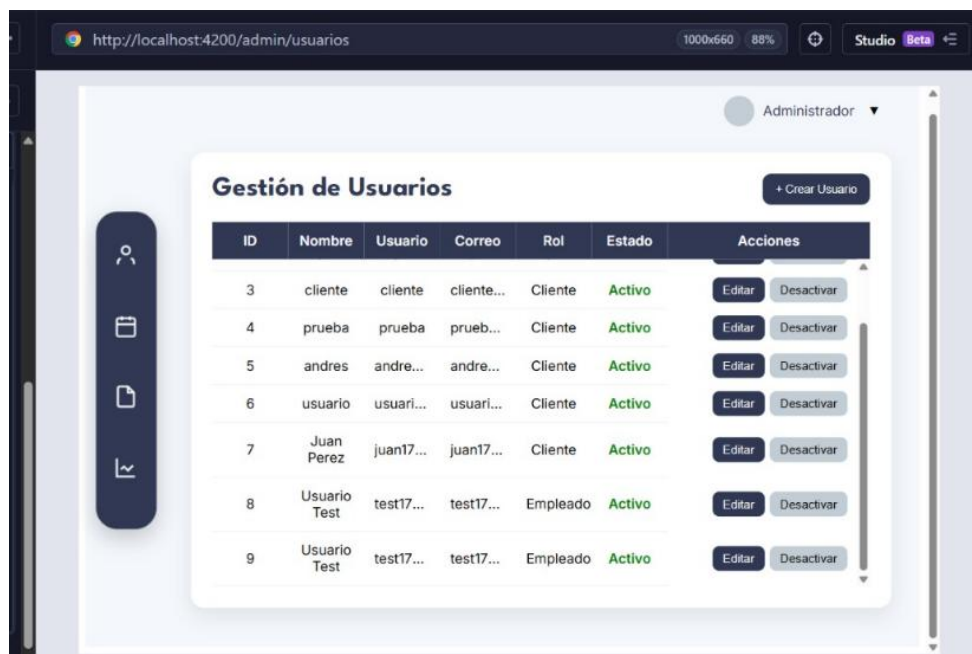


Figura 8. Modulo servicios

